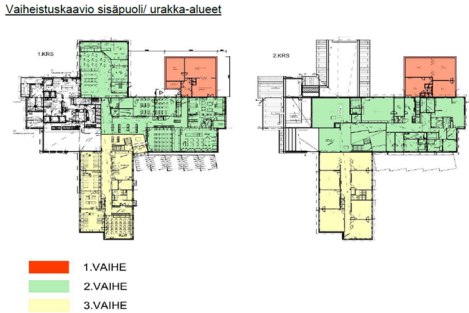


TYÖMAATIEDOTE

Maunun koulun laajennus ja peruskorjaus	Huhtikuu 2021
	
Aikataulu	Urakkasopimus allekirjoitettu 9.3.2021 Kohde jaettu kolmeen vaiheeseen: - 1. ja 2. vaihe valmis 17.12.2021 - 3. vaihe 3.1.2022 – 30.6.2022 Työmaa edistyy yleisaikataulun mukaisesti.
Edellisten viikkojen aikana tehtyt ja nyt käynnissä olevat työt	Edellisten viikkojen aikana tehtyt työt: • Työmaan perustaminen • Teräspaalaus • Anturavalut • Salaoja- ja viemäriasennuksia Käynnissä olevat työt: • Maankaivuutyöt ja täytöt
Seuraavan kuukauden aikana alkavia töitä tai työvaiheita	• Sokkelielementtien asennus • Alapohjan työt • 1. krs runkotyöt
Työturvallisuus	• TR-mittauksia ei ole vielä aloitettu. Kunnossapitotarkastukset käytössä • Ei työtatapaturmia, eikä läheltä piti -tilanteita
Menneet palaverit ja kokoukset	• Rakennusvalvonnan aloituskokous 11.3.2021 • Työmaakokous 1 – 28.4.2021
Tulevat palaverit ja kokoukset	• Työmaakokous 2 - 25.5.2021
Muuta huomioitavaa	• Ei muita huomioita
Terveisin 30.4.2021	<i>Aleksi Nyroos</i>
